

FLASH INFO

Romainville, le 06/10/2020

Le 06 octobre 2020

Avancement travaux du chantier Place Carnot

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Prolongement de la Ligne 11 du métro à l'Est, nous tenons à vous faire un point sur l'avancement des travaux de la future station Place Carnot.

- Le creusement de la voûte (partie supérieure) de la chambre souterraine est terminé.
La réalisation du revêtement en béton de la voûte est réalisée à l'avancement et durera jusqu'à fin octobre.



Nous avons également entamé l'excavation de la contre-voûte (partie inférieure de la chambre souterraine). Cette opération entraîne une intensification de l'activité (creusement et évacuation des déblais) y compris la nuit. Elle devrait s'achever fin octobre. Pour réduire les nuisances sonores observées dernièrement par les riverains, l'usage des engins bruyants est privilégié en journée et des rappels ont été faits auprès du grutier lors de la manipulation de la benne.


Ces opérations permettent de constituer le volume nécessaire pour accueillir les quais de la future station et de préparer l'arrivée du tunnelier SOFIA à Place Carnot dans les mois à venir.

Par ailleurs, les travaux de génie civil de la station ainsi que de l'accès secondaire se poursuivent.

- Le génie civil du deuxième niveau de la station Place Carnot est achevé. Le troisième niveau est en cours de réalisation.



- Le creusement du couloir de l'accès secondaire est terminé.

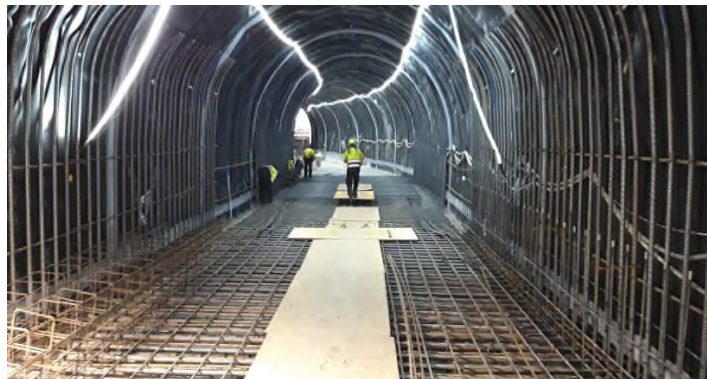

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier.

L'équipe projet RATP

POUR EN SAVOIR PLUS

Amandine RAMIN-CABY
Chargée d'information de proximité
Agence de Développement Territorial
pour la Seine-Saint-Denis RATP

Amandine.caby@ratp.fr

Tel : 06 10 56 26 82
